
VAARANLAMMEN MONITOIMITALO



Viikkotiedote 33/24

TYÖMAALLA TAPAHTUNUT KULUNEEN VIIKON AIKANA



- Maanrakennustyöt jatkuivat piha-alueilla täyttö- ja routaeristystöillä, sekä pihakivetysten pohjatöillä
- Sähköputkituksia ja johdotuksia jatkettiin kaikilla lohkoilla
- LVI- töitä jatkettiin kaikilla lohkoilla
- Räystäiden panelointitöitä ja ikkunoiden smyygilaudoituksia jatkettiin
- Väliseinätöitä jatkettiin A-, B- ja C-lohkoilla 2. kerroksessa
- Piharakennusten perustuksien ja kourujen töitä jatkettiin piha-alueilla
- Tasoitus- ja maalaustyöt saatiin valmiiksi A-lohkolla 1. kerroksessa
- Tasoitus- ja maalaustöitä jatkettiin C-lohkolla 1. kerroksessa ja B-lohkolla 2. kerroksessa
- Ikkunoiden ja räystäiden pellityksiä jatkettiin
- Seinien vesieristys- ja laatoitustöitä jatkettiin B-lohkon 1.kerroksessa
- Pihakivetysten asennus aloitettiin
- Leikkivälineiden asennusta jatkettiin
- Ilmastointikonehuoneiden lattiat pinnoitettiin



Työmaalla työskenteli viikon aikana 11 kirvesmiestä, 4 rakennusmiestä, 4 apumiestä, 4 rakennussiivoojaa, 1mittamiestä, 5 maanrakentajaa, 4 putkiasentajaa, 2 sähköasentajaa, 1 timanttikoraria, 4 maalaria, 2 tasoittajaa, 2 laatoittajaa, 2 pihakiviasentajaa, 2 leikkivälineasentajaa

TONTILLA TAPAHTUU SEURAAVAN VIIKON AIKANA



- Sähkö ja LVI-töitä jatketaan
 - Maanrakennustöitä jatketaan piha-alueilla
 - Levyväliseiniä jatketaan A-, B- ja C-lohkoilla 2. kerroksessa
 - Tasoite- ja maalaustöitä jatketaan ja B-lohkolla 2. kerroksessa
 - Vesieristys- ja laatoitustöitä jatketaan A- ja B-lohkoilla 1. kerroksessa
 - Piharakennusten töitä jatketaan
 - Ikkunoiden ja räystäiden pellityksiä jatketaan
 - Ikkunoiden smyygilaudoituksia ja räystäiden panelointitöitä jatketaan
 - A-lohkon 1. kerros valmistuu P1-alueeksi
 - Pihavarusteiden asennusta jatketaan
 - Pihakivetysten asennusta jatketaan
-

KIITOKSET KULUNEESTA VIIKOSTA

Uuden TR mittauksen tulos 14.8.2024

97,27%

TR mittausten keskiarvo 97,03%

TR mittaus on yleisesti rakennustyömailla käytössä oleva työturvallisuuden arviointimenetelmä, jonka avulla saadaan kartoitettua työmaan turvallisuustasoa.



Rakentavin terveisin

Projektipäällikkö: Tommi Paajanen, 040 641 8034, tommi.paajanen@sakela.fi

Vastaava työnjohtaja: Jouni Ylitalo, 050 466 5690, jouni.ylitalo@sakela.fi

Työnjohtaja Julius Juvonen, 044 493 7187, julius.juvonen@sakela.fi

Työnjohtaja Anna Uusitalo, 0449016751, anna.uusitalo@sakela.fi

Työnjohtaja Juho Luhtala, 0444918708, juho.luhtala@sakela.fi

Työnjohtaja Aatu Erkkilä, 0449010456 aatu.erkkila@sakela.fi

Projekti-insinööri Noora Valkonen, 044 493 9683, noora.valkonen@sakela.fi


A-lohko

Pohjakerros +134,40
1. kerros +138,10
2. kerros +142,10

B-lohko

C-lohko

LOHKOJAKO

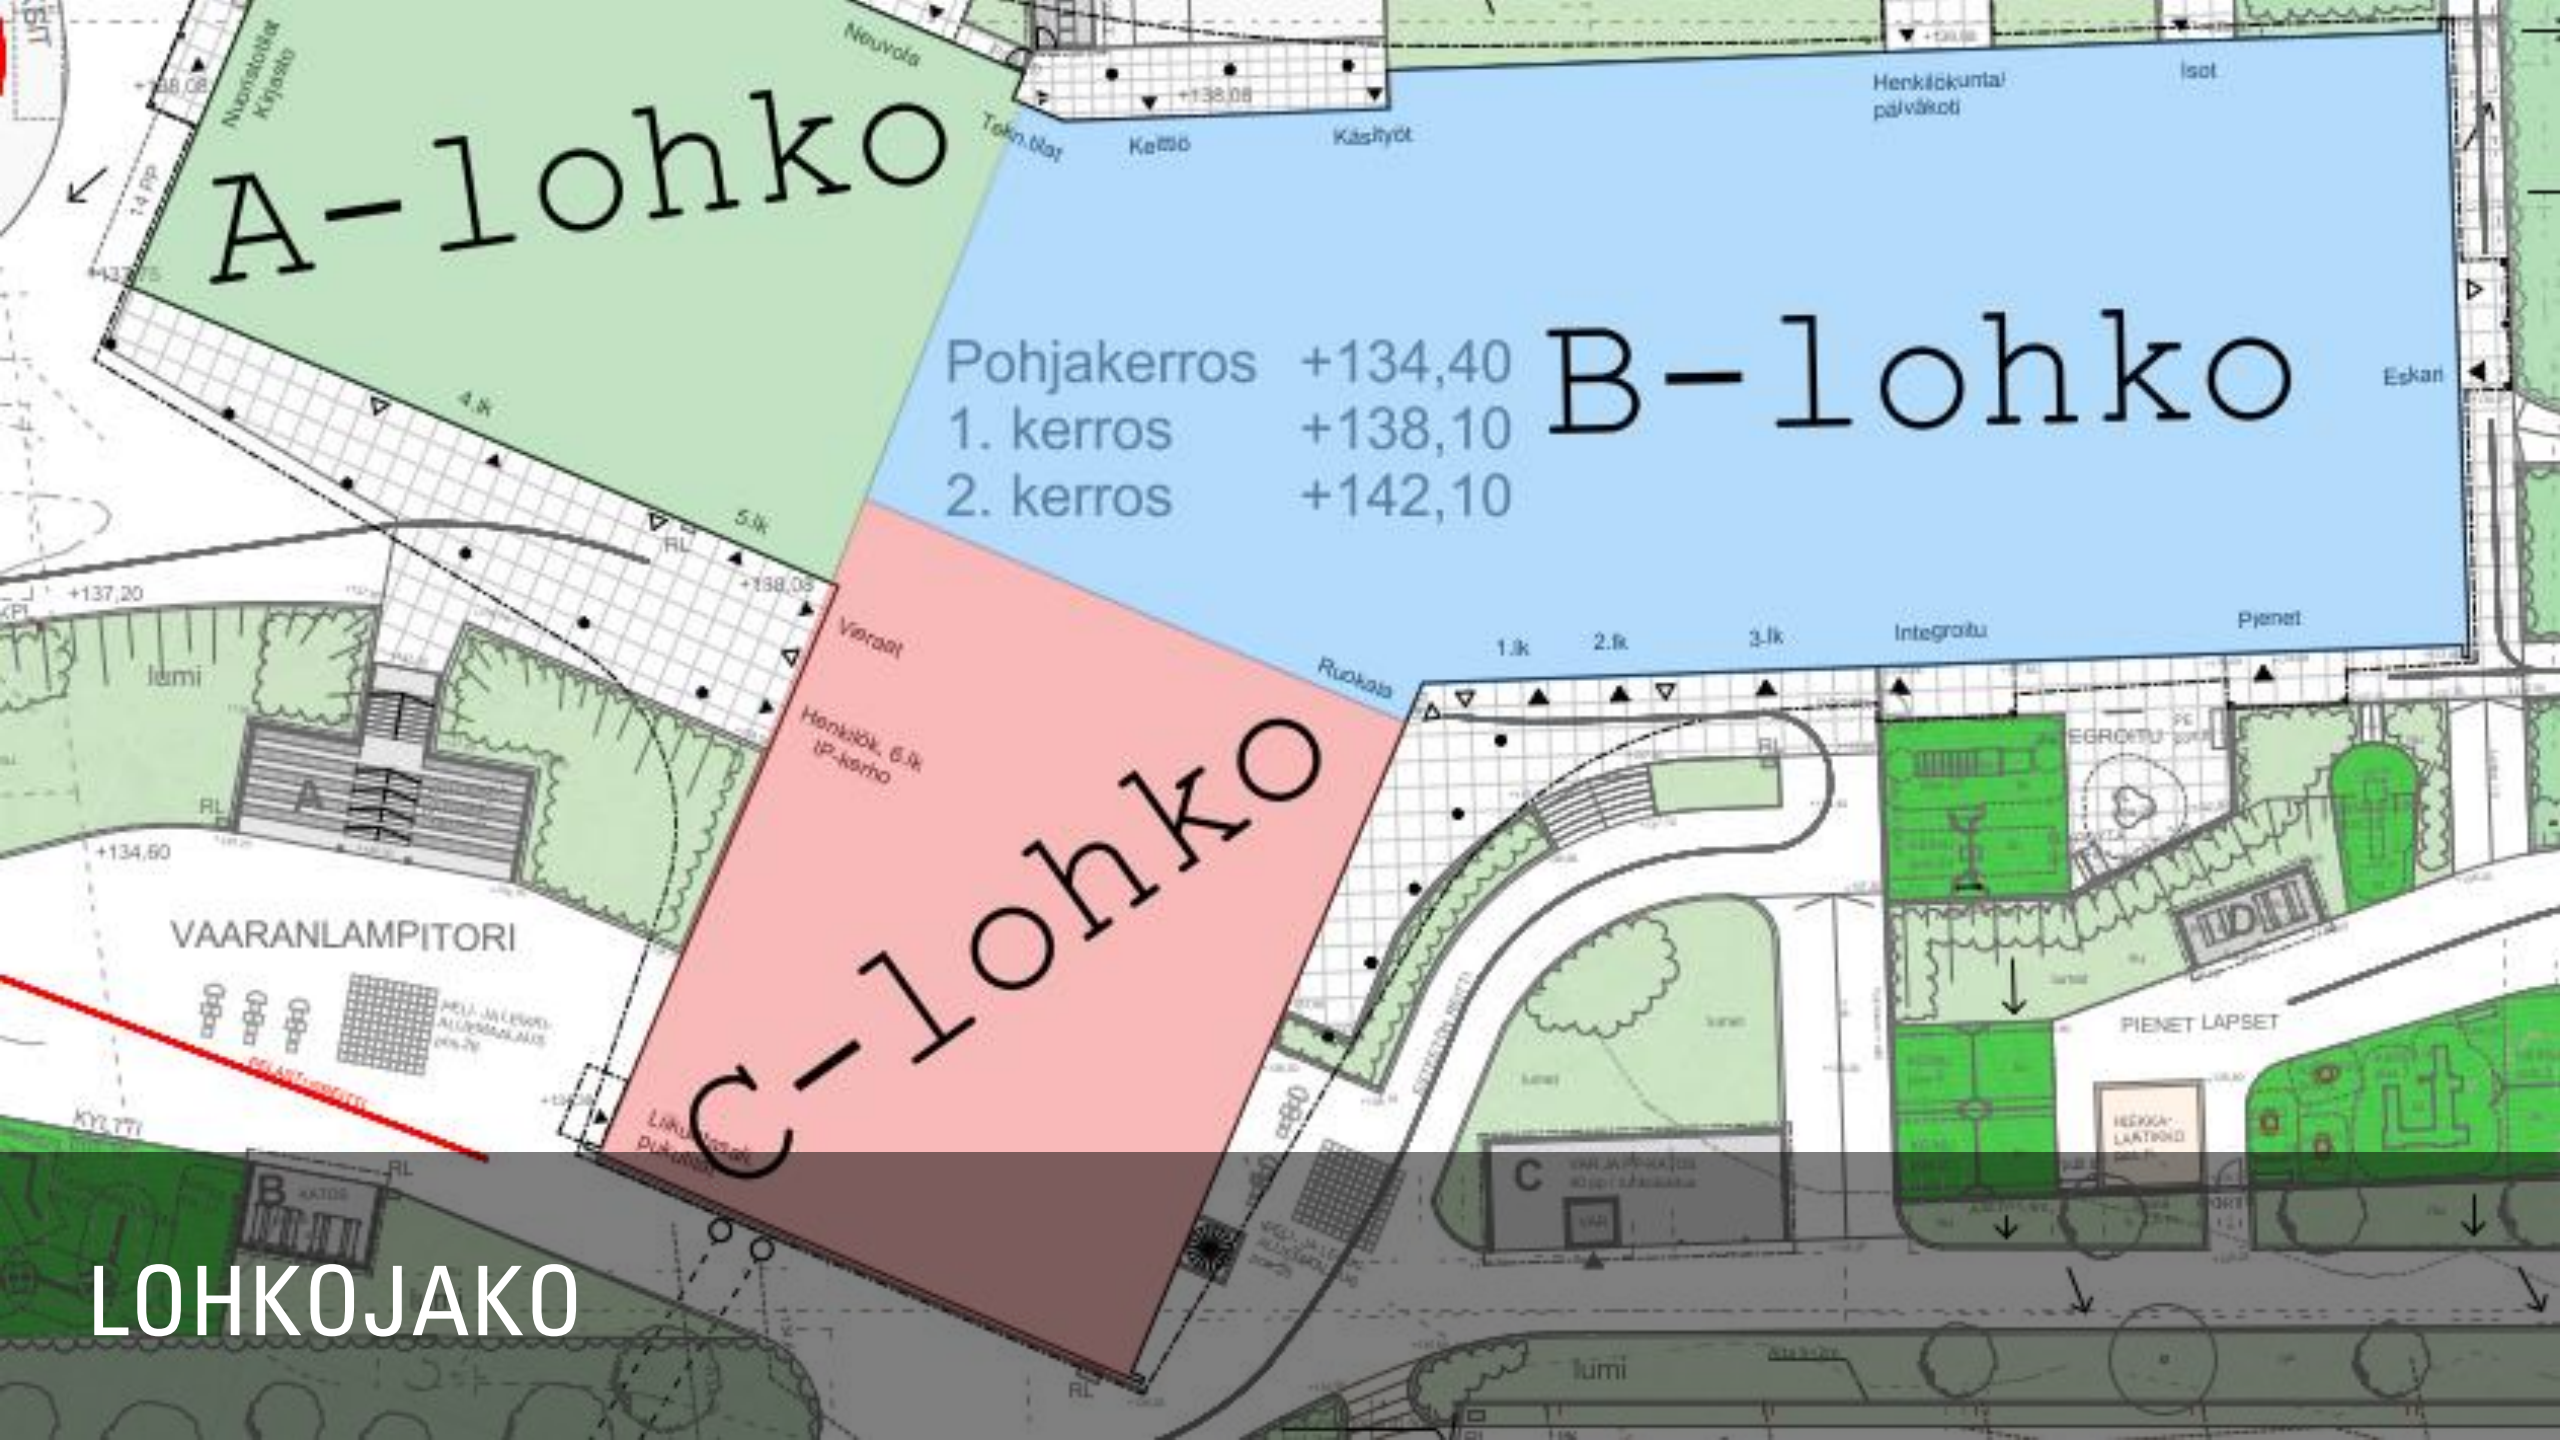



VALOKUVIA

Räystäiden otsapellitykset aloitettiin



VALOKUVIA

Tasointyöt aloitettiin B-lohkon 2.
kerroksessa



VALOKUVIA

Pihakivetysten asennus aloitettiin



VALOKUVIA

Ilmastointikonehuoneiden lattiat
pinnoitettiin
