

ROVANIEMEN KAUPUNGINTALO

PERUSKORJAUS




Viikkotiedote 06/26

TAPAHTUNUT KULUNEELLA VIIKOLLA

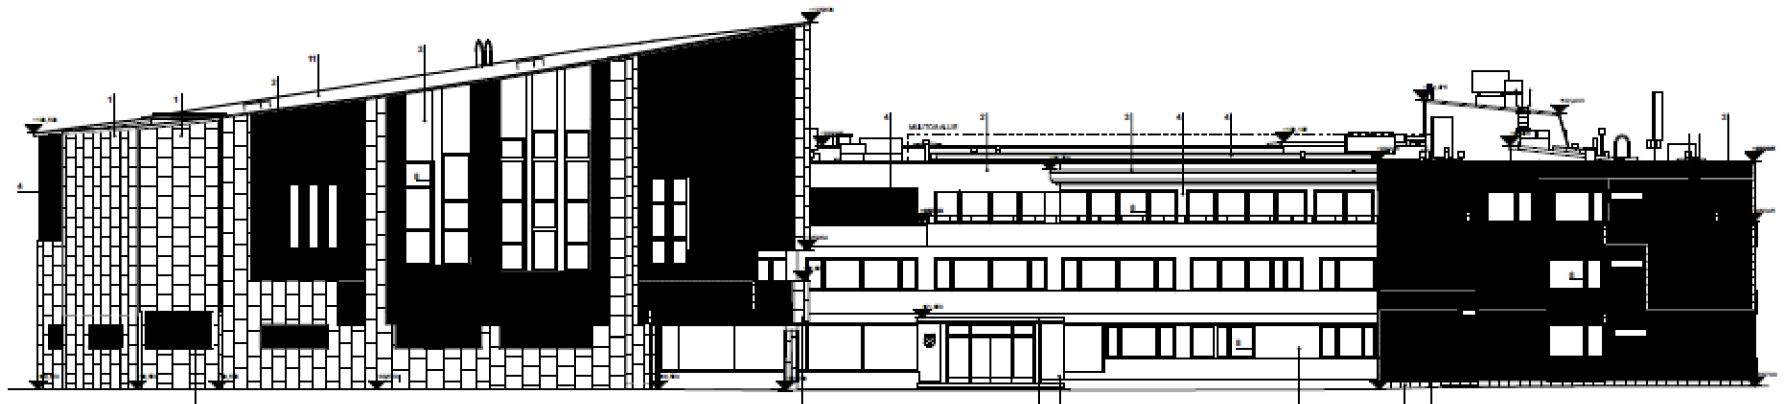


- 0 krs kapillaarikatkojen tekeminen
- 0 krs purkutytöt
- 0 krs C – lohkon lattiavalu
- 0 krs A lohkon maalaus- ja tasoitetyöt
- 0 krs D lohkon muuraustyöt
- 1 krs C – D lohkon alakattotyöt
- 1 krs B – D lohkojen sähköasennukset
- 1 krs B – D lohkojen LVI-asennukset
- 2 krs ovikarmien huoltomaalaus
- 2 krs valtuustosalin kulkusiltojen rakentaminen
- 2 krs B – D lohkojen LVI-asennukset
- 2 krs B – D lohkojen sähköasennukset
- 2 krs C – D lohkojen alakattotyöt
- 2 krs säilyvien puupintojen kunnostustyöt
- 3 krs C – D lohkon alakattotyöt
- 3 krs B – D lohkon LVI-asennukset
- 3 krs B – D lohkon sähköasennukset
- 3 krs B – D lohkon lattian pintamateriaalin asennus
- IV-konehuoneen lattian pinnoitus



TAPAHTUU TULEVALLA VIIKOLLA

- 0 krs kapillaarikatkojen tekeminen
- 0 krs purkutytöt
- 0 krs A lohkon maalaus- ja tasoitetyöt
- 0 krs B – D lohkon muuraustyöt
- 1 krs C – D lohkon alakattotyöt
- 1 krs B – D lohkojen sähköasennukset
- 1 krs A – D lohkojen LVI-asennukset
- 2 krs ovikarmien huoltomaalaus
- 2 krs valtuustosalin kulkusiltojen rakentaminen
- 2 krs B – D lohkojen LVI-asennukset
- 2 krs B – D lohkojen sähköasennukset
- 2 krs C – D lohkojen alakattotyöt
- 2 krs säilyvien puupintojen kunnostustyöt
- 2 krs D lohkon lattian pintamateriaalin asennus
- 3 krs C – D lohkon alakattotyöt
- 3 krs B – D lohkon LVI-asennukset
- 3 krs B – D lohkon sähköasennukset
- 3 krs C lohkon lattian pintamateriaalin asennus
- 3 krs väliovien asennus
- 3 krs taukokeittiö kalusteiden asennus
- IV-konehuoneen lattian pinnoitus

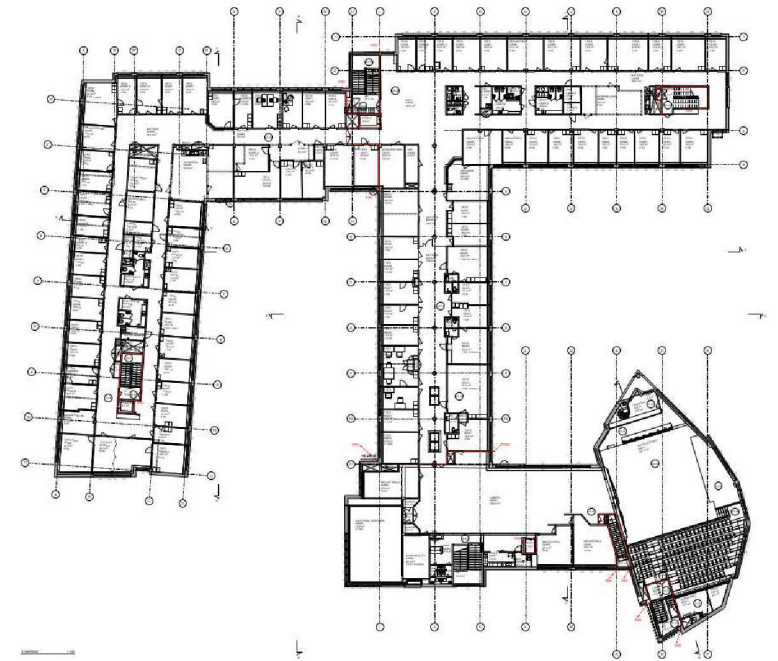

TYÖMAAN RESURSSIT



Työmaalla työskenteli kuluneella viikolla

- 5 Työnjohtajaa Sakela Rakennus Oy
- 36 rakennustyöntekijä Sakela Rakennus Oy
- Työnjohtaja Lapin Timanttisahaus Oy
- 8 rakennustyöntekijä Lapin Timanttisahaus Oy
- 2 maalaria Maalausliike Laitila Oy
- Työnjohtaja LVI-Lämsä Oy
- 18 asentajaa LVI-Lämsä Oy
- 8 asentajaa NK Tekniikka Oy
- 2 asentajaa JK-Saumaukset Oy
- 2 asentajaa Mattoasennus Ojala Oy
- 1 asentaja Oulun Kattopalvelu Oy

Yhteensä

- Työnjohto Sakela 5 hlö
 - Työnjohto aliurakoitsija 2 hlö
 - Rakennustyöntekijä / asentaja 77 hlö
-

KIITOKSET KULUNEESTA VIIKOSTA

TYÖTURVALLISUUS


Uudet TR mittauksen tulokset 3.2.2025

97,12 %

TR mittauksen keskiarvo 97,40 %

Tapaturmattomien työpäivien
lukumäärä

102

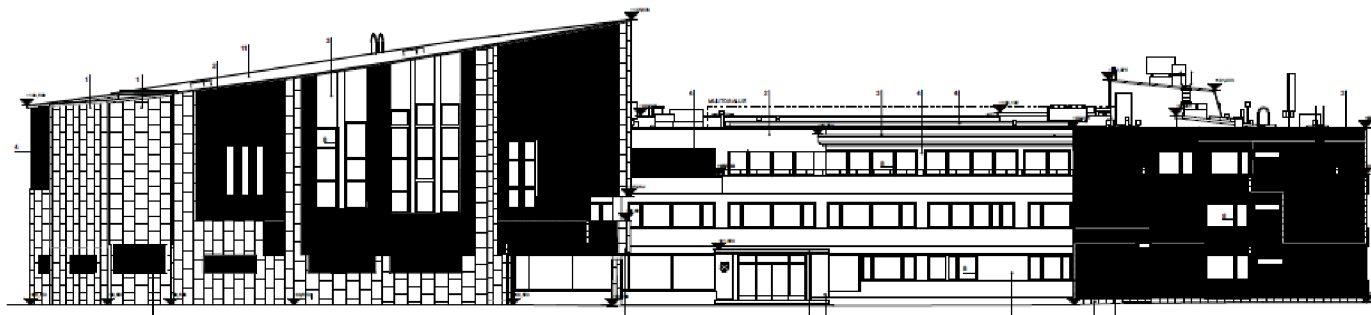

Rakentavin terveisin

Projektinjohtaja	Ville Alasalmi	050 322 8776	ville.alasalmi@sakela.fi
Projektipäällikkö	Mikko Karppinen	050 413 0332	mikko.karppinen@sakela.fi
Vastaava työnjohtaja	Joel Hyvönen	044 493 5905	joel.hyvonen@sakela.fi
Työnjohtaja	Marko Välimaa	044 565 9498	marko.valimaa@sakela.fi
Työnjohtaja	Juho Luhtala	044 491 8708	juho.luhtala@sakela.fi
Työnjohtaja	Julius Juvonen	044 493 7187	julius.juvonen@sakela.fi
Työnjohtaja	Juho Mäkeläinen	044 902 2708	juho.makelainen@sakela.fi
Työnjohtaja	Heikki Granlund	044 902 2622	heikki.granlund@sakela.fi
Työmaainsinööri	Arttu Valkama	050 539 9266	arttu.valkama@sakela.fi



VALOKUVIA

0 krs C – lohkolla lattioita
valettu



VALOKUVIA

3 krs D – lohkolla
kvartsivinyylin asennus
käynnissä



VALOKUVIA

3 krs B – lohkolla
toimistohuoneiden lattian
pintamateriaalin asennus
käynnissä



VALOKUVIA

3 krs C – lohkolla
käytävän lattiat suojattu

VALOKUVIA

IV-konehuoneen lattian
pinnoitus käynnissä

