

TAPIO *

**Tarjous:
Metsäohjelman
laadinta**

Rovaniemen kaupunki

12.12.2024



TARJOUS:

Rovaniemen metsäohjelma

Kiitämme mahdollisuudesta tarjoata asiantuntumustamme Rovaniemen metsäohjelman laadintaan


Olemme laatineet teille ehdotuksen metsäohjelman laadinnasta ja siihen liittyvästä osallistamisprosessista. Projektin työohjelma on rakennettu siten, että toisiaan seuraavat työvaiheet antavat tuloksia seuraavaan työvaiheeseen ja edistävät Rovaniemen metsäohjelman valmistelua mielekkäästi, tilaajan tarpeet huomioiden ja resurssit järkevästi kohdentaa.

Olemme auttaneet viime vuosina useita kaupunkeja metsäohjelman laadinnassa ja tulevaisuuden suuntaviivojen määrittelyssä.

Tarjouksen mukaisen työn lopputuloksena on metsäohjelma, jossa on otettu huomioon sekä metsien käyttäijien näkemykset että tausta-aineistoihin ja metsälaskentatuloksiin pohjautuva metsien kehitys.

Toivomme, että tarjouksemme johtaa yhteistyöhön kanssanne.


Tarjous on voimassa 31.12.2024 asti.





TAPIO

Työn tausta



Metsäohjelmalla määritetään pitkän tähtäimen tavoitteet kaupungin omistamien metsien hoidolle ja käytölle.

Metsäohjelma on yhteinen näkemyksensä kaupungin metsien tulevaisuudesta.

MITÄ?

Rovaniemen metsäohjelmassa määritetään pitkän tähtäimen tavoitteet Rovaniemen kaupungin omistamien metsien hoidolle ja käytölle.

Metsäohjelma kertoo asukkaille ja luottamushenkilöille, miten kaupunki toimii erilaisissa omistamissaan metsissä, miksi kaupungin metsiä hoidetaan sekä mitkä arvot ohjaavat metsähaittoita.

Metsäohjelma kertoo asukkaille myös sen, millaisia hyötyjä ja hyvinvointivalikoituksia kaupungin metsät tuottavat heille.

MITEN?

Metsäohjelma on osa valmistellolla olevan Rovaniemen yleiskaavan taustaselvityksiä. Kaupungin omistamilla metsillä on merkitystä taloudellisten tulojen lisäksi mm. luontomatkailun mahdollistajana ja arvokkaiden maisema-arvojen ylläpitäjänä.

Metsäohjelman luodaan edellytykset monipuolisten virkistysmetsien ylläpitämiseelle, kestävälle metsähoidolle ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiselle.

Metsäohjelman tavoitteet ja niitä toteuttavat toimenpiteet.

Työhön sisältyvällä osallistamisprosessilla selvitetään käytäjiiltä, millaisia ovat Rovaniemen kaupungin metsiin kohdistuvat arvot ja odotukset. Työssä hyödynnetään myös metsäläiskennen tuloksia.

Eri sidosryhmien osallistamisen, asianantijatyön ja vuorovaikuttelisen ohjausryhmätyön avulla laaditaan eri metsäalueiden (kaavamerkintöjen alueet) hoidon tavoitteet ja niitä toteuttavat toimenpiteet.

12.12.2024

Työn tavoitteet

- Työn tavoitteena on tunnistaa ja kuvata Rovaniemen kaupungin metsäomaisuuden ominaisuudet, metsienhoidon toimintaympäristö ja siihen vaikuttavat keskeiset tekijät. Nämä huomioidaan metsähjelman sisällössä.
- Metsien hoidon ja käytön tavoitteet määritellään yhteisesti. Tavoitteet ja niiden saavuttamista tukevat toimenpiteet kuvataan valmiissa strategiassa yleisesti ja yleiskaavan merkintöjä vastaavienalueiden mukaan.
- Työohjelmamme on rakennettu siten, että metsien hoidon tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat sekä riittävään tietopohjaan että osallistamisen tuloksiin. Tavoitteiden muodostamisessa hyödynnetään laskentatuloksia ja niiden johtopäätöksiä.
- Työohjelmassa on otettu huomioon metsälaskennat, joista on toimitettu erillinen tarjous. Metsälaskentojen tuloksia hyödynnetään metsähjelman valmistelussa.
- Metsähjelman tavoitteiden mukaisen metsien hoidon vaikuttuksia metsien kehitykseen, luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastoön arvioidaan asiantuntijatyönä sekä Rovaniemen kaupungille toteutettavien metsälaskentojen tulosten avulla.
- Ohjelman tavoitteena on luoda konsensus metsien käytöstä eri sidosryhmien välillä.




*Valmis, vahvistettu
metsähjelma on linjaus
siiä, miten Rovaniemen
kaupungin metsiä
hoidetaan.*



TAPIO

Työohjelma

Työohjelma

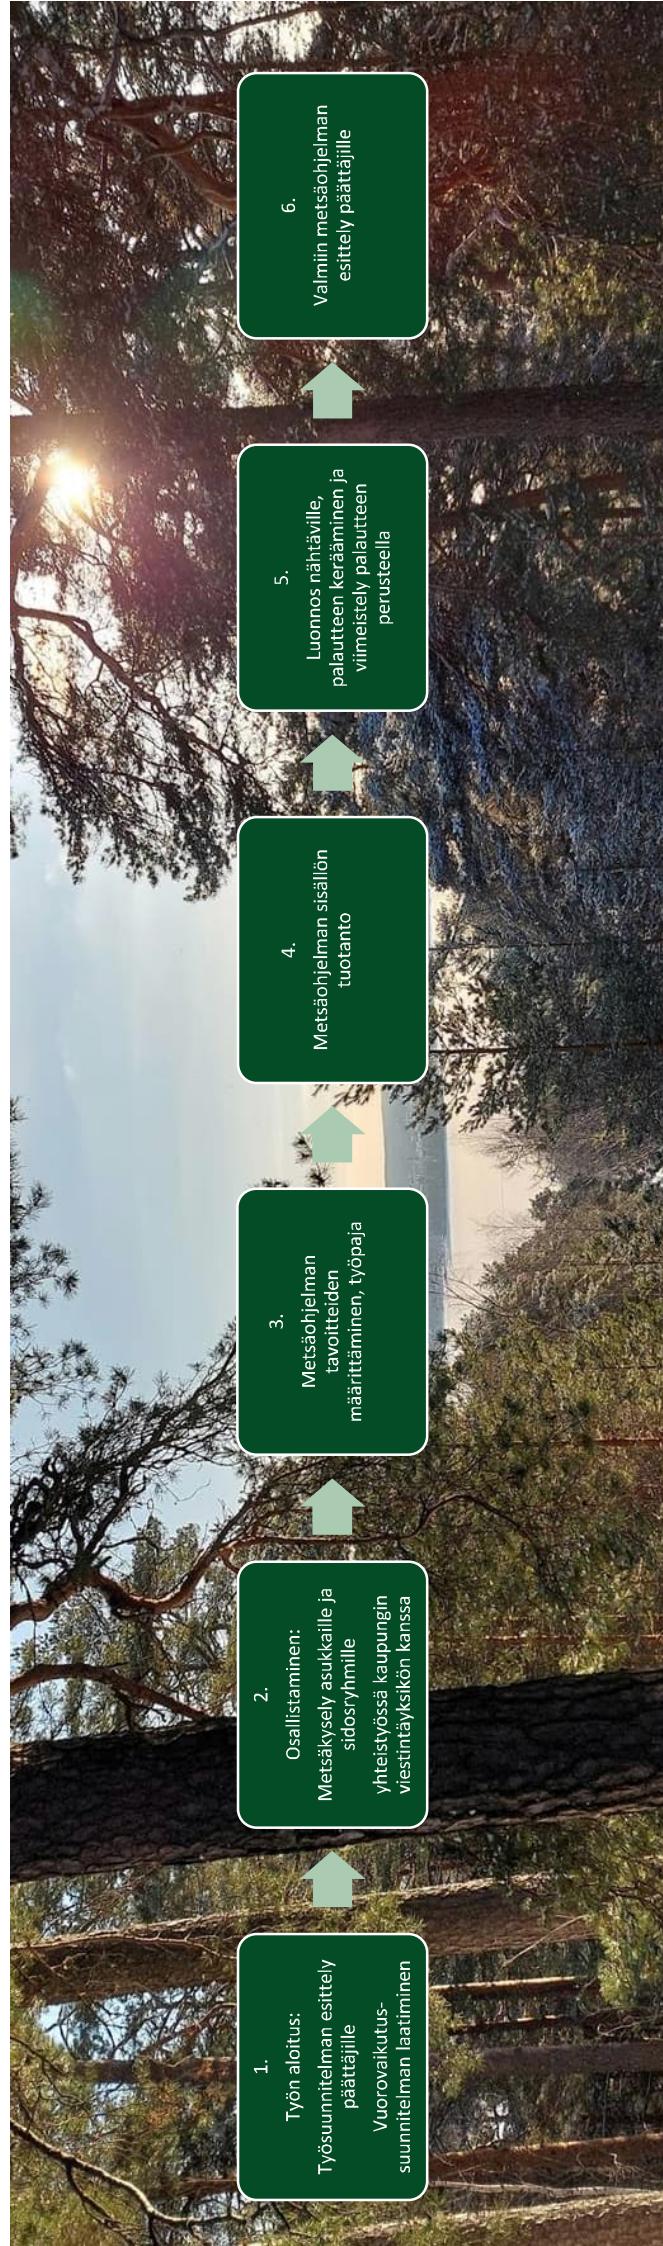

Suunnittelijoinen viestintä työn etenemisen rinnalla

Ohjausryhmän työskentely vie työtä eteenpäin työvaiheittain.



Ehdotus työohjelman vaiheista 1-2

TAPIO

		<p>TYÖVAIHEEN TULOKSET:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aloituskokouksessa tarkennetaan tarjouksen työohjelma työsuunnitelmaksi, vahvistetaan ohjausryhmän kokoonpano ja hyväksytään Tapion laatima vuorovaikuttusuunnitelma osana työsuunnitelmaa. Ohjausryhmän kokoonpanossa kiinnitetään huomiota siihen, että tiedonkulku toimii yleiskaavan valmiste lutyön suuntaan. Tapio laatii asialistat ja muistiot ohjausryhmän kokouksista. Rovaniemen kaupungin edustaja esittelee metsäohjelman työsuunnitelman päättäjille (esimerkiksi tekninen lautakunta). Työn toteutusta varten perustetaan tilaajan ja konsultin käyttöön yhteinen sähköinen projektikansio (esimerkiksi Teams).
1	TYÖN ALOITUS: Aloituskokous, lähtöaineisto ja työohjelma esittely päättäjille, vuorovaikuttusuunnitelma	<p>TYÖVAIHEEN TULOKSET:</p> <ul style="list-style-type: none"> Viestintä metsäohjelman työsuunnitelmaan koskee <ul style="list-style-type: none"> Päättäjät Yleinen tiedottaminen Vuorovaikuttusuunnitelma
2	OSALLISTAMINEN: Metsäkysely asukkaille ja sidosryhmille yhteistyössä kaupungin viestintäyksikön kanssa	<p>TYÖVAIHEEN TULOKSET:</p> <ul style="list-style-type: none"> Viestintä metsäkyselystä Metsäkyselyjen sulkeuduttua Tapio laati vastauksista tiiviit pptx/pdf-muotoiset raportit. Tilaa ja saa vastausaineiston raakadatan ja siihen liittyvät paikkatiedot (mikäli karttavastauksia kerätään). Kyselystä saadaan yleisiä suuntaviivoja metsäohjelman laadintaan. <p>Tapio laatii avoimen metsäkyselyn yhteistyössä kaupungin viestintäyksikön kanssa. Kysellä kerätään tietoa asukkaiden, sidosryhmien ja luottamuksenhenkilöiden metsiin liittyvistä arvoista ja odotuksista. Metsäkysely antaa vastaajille mahdollisuuden kertoa ja perustella, mitkä metsäkoheet ja alueet kaupungin metsistä ovat heille merkityksellisiä sekä kertoo kaupungin metsien hoitoon liittyvistä toiveista.</p> <p>Metsäkyselystä viestitään digitaalisilla kanavilla näkyvästi ja innostavasti. Jotta metsäkyselylle saadaan laaja ja kattava vastaajapohja, kyselyn vastauslinkit viedään näkyviin Rovaniemen kaupungin toimesta sinne missä ihmiset liikkuvat: lenkipolkujen ja ulkoilureittien varteen, laavuille, nuotiopaikoille ja luontopolulle.</p> <p>Kyselyjen toteutuksen jälkeen niiden tulokset käydään läpi ohjausryhmässä ja ne otetaan syötteenä mukaan metsäohjelman tavoitteiden määrittelyyn.</p>

Ehdotus työohjelman vaiheista 3-4

<p>Metsäohjelman Tavoitteiden määrittäminen, työpaja</p> <p>3</p> <p>Työryhmä (Tapion asiantuntijat ja tilaajan edustaja) laatii tavoitteet metsien hoidolle ja käytölle. Alustavien tavoitteiden määrittelyssä hyödynnetään metsäkyselyn tuloksia, erilisenä työnä toteutettavien metsäaskentojen tuloksia ja muuta soveltuva lähtöaineistoa.</p> <p>Tavoitteet esitellään ja työstetään valmiiksi vuorovaikuttaisessa työpajassa, jonne kutsutaan ohjausryhmän lisäksi mahdollisia muita sisäistä ja ulkoisten sidosryhmiensä edustajia. Osallistujiissa painotetaan maakäytön suunnittelun osallistuvia kaupungin yksiköitä ja yleiskaavatyön toteuttajia. Työpajassa luonnonstellaan tavoitteiden lisäksi niiden toteutukseen vaadittavia toimenpiteitä. Työpaja toteutetaan etäyhteyksillä.</p> <p>Metsäohjelman ohjausryhmä tarkentaa ja hyväksyy työryhmän määrittämät tavoitteet ja toimenpiteet.</p>	<p>TYÖVAIHEEN TULOKSET:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metsäohjelman kunnossapitoluokkakohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet
<p>Metsäohjelman sisältö rakentuu ohjausryhmän vahvistamien metsähoidon tavoitteiden, muiden osallistamisen tulosten ja muiden soveltuivien lähtöaineistojen pohjalta. Metsäohjelman luonnos sisältää metsähoidon tavoitteiden lisäksi niiden toteuttamiseen tarvittavat toimenpiteet. Sisällön koostamisessa hyödynnetään myös Tapion tuottamien laskentojen tuloksia ja johtopäätöksiä.</p> <p>Tapio koostaa metsäohjelman luonnonkseen työ- ja ohjausryhmän avulla. Metsäohjelman alustava sisällysluettelo on kuvattu sivulla 20 ”Esimerkki: metsäohjelman rakenne”. Työhön on resursoitu yksi ohjausryhmän kommenttiikerros luonnonksesta ja siihen liittyvät korjaukset Tapion tekemänä.</p> <p>Sisällön tuotannossa kiinnitetään huomiota tekstin lähestyttävyyteen ja esitystavan selkeyteen ja visualiseen ilmeeseen. Metsäohjelma muotoillaan visuaaliseksi ja informatiiviseksi esitykseksi.</p>	<p>TYÖVAIHEEN TULOKSET:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metsäohjelman luonnos
<p>Metsäohjelman sisällön tuotanto</p> <p>4</p>	

Ehdotus työohjelman vaiheista 5-6

		TYÖVAIHEEN TULOKSET:
5	Luonnos nähtävillä, palautteen kerääminen	<p>Luonnos asetetaan nähtäville kaupungin verkkosivuille. Palautetta kerätään verkkolomakkeella. Vastauslomakkeen linkkiä on helppo jakaa osana työn viestintää.</p> <p>Ohjausryhmä päätää, mitä muutoksia luonnokseen tehdään saadun palautteen perusteella. Tapio tekee ohjausryhmääsä sovitut muutokset metsähjelmaan.</p> <p>• Viestintä metsähjelman luonnoksesta</p> <p>• Koottu palautte luonnoksesta</p> <p>• Vahvistettu ja viimeistely kirjallinen metsähjelma litteineen</p>
6	Valmiin työn esittely	<p>Valmis metsähjelma esitellään sovitulle kohderyhmälle, esimerkiksi tekkinen lautakunta. Tapio valmistelee esittelyaineiston ja esittelyohjelman.</p> <p>• Esittely sovitulle kohderyhmälle</p> <p>• Viestintä metsähjelman valmistumisesta</p>



TAPIO

Tapion hyviä projektikäytäntöjä

Yleiset projektikäytännöt:

- Työn onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi työryhmäämme kuuluu laadunvarmistaja.
- Olemme nimenneet projektipäällikön varahenkilöksi kokeneen metsääsiantuntijan, jotta työ etenee aikataulussa mahdollisista sairastapauksista tms. huolimatta.

Ohjausryhmä ja työryhmä:

- Ehdotamme, että lisäksi työn valmisteluun perustetaan työryhmä, johon kuuluvat tilaajan projektipäällikkö sekä Tapiola projektipäällikkö ja metsääsiantuntija. Työryhmä hoitaa projektin käytännön asioita ja pitää tarvittaessa lyhytä työpalavereita. Tämä tukee projektin onnistunutta toteutusta.
- Työtä ohjaavan ohjausryhmän kokouksissa työtä viedään eteenpäin yhteisillä päätöksillä. Ohjausryhmän kokoonpano sovitaan työn aloituskokouksessa.
- Osa ohjausryhmän työskentelystä varataan työpajamaiseen työskentelyyn välivaiheiden tulosten tarkentamiseksi ja jalostamiseksi.

Työn kustannussarvio



Työmääriä- ja kustannusarvio työvaiheitain TAPIO

Tällä sivulla on esitetty arviomme esityksen mukaisen Rovaniemen metsäohjelman valmistelun työajasta ja kustannuksista.

Sovittua hintaa ei ylitetä ilman tilaajan suostumusta.

Tarjouksen mukainen työn hinta on 19 000 € (alv. 0%).

Työ laskutetaan kahdessa erässä:

- **Työvaiheiden 1-3 valmistuttua laskutetaan 40 % hinnasta**
- **Muiden työvaiheiden valmistuttua laskutetaan 60 % työn hinnasta**

Tilaaja vastaa mahdollisista tila- tai tarjoulikustannuksista.

Lisätöistä sovitaan erikseen tilaajan kanssa. Lisätyöt tehdään työhön nimetyn työryhmän toimesta. Lisätöiden hinta koko työryhmän osalta on 125 €/h (alv 0%).

OPTIO:

Työn luonnosvaiheessa on mahdollista toteuttaa ohjelmapalveluyrittäjille erillinen osallistamistilaisuus, esimerkiksi työpaja. Tästä sovitaan erikseen.

Työvaihe	Työmääriä, htp	Aikataulu-ehdotus	Tapion odotukset asiakkailta
1) ALOITUS JA TYÖOHJELMAN TARKENNUKSET	1,5	09/2024	Ohjaus- ja työryhmien kokoaminen ja niihin liittyvät tehtävät seuraavissa työvaiheissa.
2) OSALLISTAMINEN	5	09/2024-02/2025	Osallistuminen metsäkyselyn suunnittelun
3) METSÄOHJELMAN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTÄMINEN	2	1/2025	Osallistuminen tavoitteiden määrittelyyn sekä niiden hyväksyminen ohjausryhmän työpaja-kokouksessa.
4) METSÄOHJELMAN SISÄLLÖN TUOTANTO	5	2/2025-03/2025	Metsäohjelman sisällön kommentointi.
5) LUONNOSVAIHE	3	03-04/2025	Luonnonkaan saadun palautteen käsitteily yhdessä Tapion kanssa ja päättöiset luonnonkaan tehtävistä muutoksista.
6) VALMIIN TYÖN ESITTELY	1,5	05/2025	Käytännön järjestelyt, esityksen kommentointi
PROJEKTIN KOORDINOINTI JA LAADUNVARMISTUS	2	09/2024 - 05/2025	Ulkoinen viestintä
	20		



TAPIO

Työryhmä

Työryhmä



Anna Viitamäki

Anna Viitamäki (MM) toimii metsää- ja paikkatiotointimissä metsätietoasiantuntijana. Hän toimii ForestKIT-metsäsuunnittelijärjestelmän tuoteomistajana ja vastaa sen kehityksestä. Hänellä on kokemusta metsävaratiedon käsittelystä, metsiin liittyvän päättökenteon tukityökaluista sekä luontoarvoista ja monimuotoisuudesta osana metsien käytöistä.

Tehtävät tässä projektissa:

- Projektipäällikkö
- Osallistaminen
- Metsähjelman sisällön tuotanto



Varpu Kuutti

Metsänhoitaja, MMM Varpu Kuutti toimii metsähoidon asiantuntijana. Varpu Kuutin vastuualueena ovat metsähoidon suositusten sisällöt, mm. ilmastoestävyyden, metsien terveyden ja laadun osalta. Hänellä on pitkä työkokemus metsänhoito-esimiehenä käytännön metsäoperaatioissa.

Tehtävät tässä projektissa:

- Metsien hoidon ja käytön tavoitteiden määrittäminen
- Osallistaminen
- Metsähjelman sisällön tuotanto



Elise Penttala

Metsätietoasiantuntija Elise Penttala (MMK) toimii metsää- ja paikkatiotointimissä metsätietoasiantuntijana. Ja vastaa ForestKIT-metsäsuunnittelijärjestelmän käytön tuesta ja testaamisesta. Hänen on toteuttanut useita vaativia laskentaprojekteja ja on kyyväks metsävaratiedon analysoija.

Tehtävät tässä projektissa:

- Metsähjelman sisällön tuotanto



Sini Miettinen

Metsänhoitaja, MM Sini Miettinen toimii asialkuuspäällikkönä metsää- ja paikkatiotointimissä. Hänellä on pitkä kokemuus monitavotitteisesta metsäsuunnittelusta ja metsien käyttäjien osallistamisesta. Miettinen on toiminut useita vuosia projektipäällikkönä kuntien metsän liittyvissä projekteissa sekä maankäytöön, luonnonhoitoon ja maisemavaikutuksiin liittyvissä töissä.

Tehtävät tässä projektissa:

- Projektiin laadunvarmistus
- Projektipäällikön varahenkilö



Esimerkkejä työn toteutustavoista



TAPIO

Osallistaminen mahdollistaa osallistumisen

- Rovaniemen metsäohjelman valmisteluun sisältyvät **osallistavat työvaliheet** on suunniteltu siten, että strategiaan saadaan koottua laaja-alaisesti ja hallitusti metsien käyttäjien, asukkaiden ja luottamushenkilöiden näkökulmia.
- Osallistamisprosessissa keskeistä on riittävä vuoropuhelu metsien hoidosta vastaavien toimijoiden ja metsien käyttäjien välillä.
 - Asukkaita, sidosryhmien edustajia ja päätäjääjä osallistetaan kolmessa vaiheessa:
 - **Työn alussa metsäkyselyllä kartoitetaan metsien käyttöä, niihin liittyviä arvoja ja toiveita**
 - **Metsäohjelman tavoitteiden muodostamisessa järjestetään työn ohjausryhmälle ja sidosryhmien edustajille työpaja.**
 - **Metsäohjelman luonnonkosken valmistuttua se asetetaan nähtäville. Luonnonkseen tehdään muutoksia saadun palautteen perusteella.**
 - Lisäksi valmis metsäohjelma esitellään sovitulle päättäjätaholle.
 - Ehdottamamme osallistamisprosessi on tehokas tapa saada näkyviin metsäohjelman valmistelun syötteeksi vaikuttava otos käyttäjäpalautetta.
 - Luottamushenkilöitä tiedotetaan työn etenemisestä.




Kuva: Heinojan kaupunki

”Osallistaminen merkitsee käytännössä prosessia, joka tekee osalliseksi ja aktivoi.”


Vuorovaikuttussuunnitelma

- Metsähjelman vuorovaikuttussuunnitelma tukee osallistamisen onnistumista ja tulosellisuutta. Vuorovaikuttussuunnitelmassa tunnistetaan osallistamisen eri kohderyhmät ja tehdään metsähjelman valmistelusta kiinnostava, helposti lähestyttävä hanke.
- Työn alussa laadittavan vuorovaikuttussuunnitelman onnistumista arviodaan, ja suunnitelmaa täsmennetään työn edetessä yhdessä tilaajan kanssa. Näin varmistetaan tavoitteita tukeva avoin ja aktiivinen vuorovaikutus.
- Työhön kuuluva vuorovaikuttussuunnitelman laatimisessa hyödynnämme projektin työryhmän tukena Tapion kokeneiden viestintääsiantuntijoiden osaamista.



Metsäkyselyn toteutus

- Metsäkyselyn toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin viestinnän kanssa. Kyselytyökaluna käytetään Rovaniemen kaupungilla käytössä olevaa sovellusta (mitkäli se sopii tarkoitukseen).
- Tapion projektiryhmä laatii kyselyn yhteistyössä ohjausryhmän kanssa.
- Kyselyn sisältö muotoillaan yhdessä työn ohjausryhmän kanssa tavoitteita vastaavaksi. Se antaa vastajille mahdollisuuden kertoa ja perustella, mitkä kaupungin metsistä ovat heille merkityksellisiä.
- Kyselyllä kartoitetaan metsien monia eri arvoja ja niihin kohdistuvia odotuksia.
- Kyselyyn voidaan kyselytyökalun ominaisuuksista riippuen sisälliyttää sanallisten kysymysten lisäksi monivalintoja, eri aiheiden tärkeysjärjestyskiä tai kartan kautta merkittavia kohteita (esim. osoita itsellesi mieluisimmat paikat metsissä).
- Vastausten käsittelyssä Tapio sitoutuu noudattamaan Rovaniemen kaupungin tietosuojaavaimuksia.

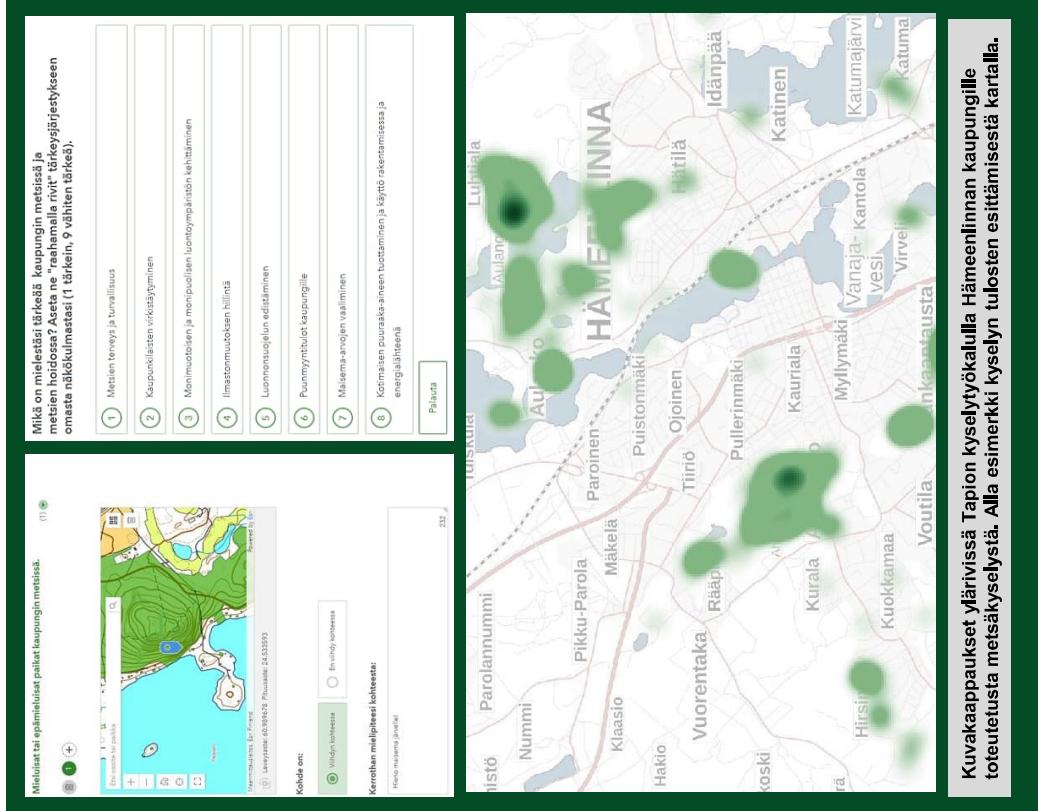

Osallistava työpaja

- Rovaniemen metsäohjelman valmisteluun sisältyvä työpaja toteutetaan laajennettuna ohjausryhmän kokouksena etäyhteyksillä.
- Mukaan kutsutaan sisäisteen ja ulkoisten sidosryhmien edustajia. Osallistujissa painotetaan yleiskaavatyön toteuttajien edustusta.
- Vuorovaikuttaisessa työpajassa muodostetaan metsäohjelman tavoitteet ja pohditaan niiden toteutukseen vaadittavia toimenpiteitä. Olemme aiemmissa vastaavissa töissä todenneet, että työpajatyöskentely sopii hyvin tavoitteiden määrittelyyn.
- Työpajan ensisijaisena tavoitteena on kerätä tavoitteisiin ohjausryhmän ja muiden osallistujien tarpeita, näkemyksiä ja kokemuksia.
- Käytämme monipuolisia työskentelymenetelmiä ja huolehdimme ammattitoisesta fasilitoinnista.
- **Hyödyt:** Työpajatyöskentely on tehokas tapa sovittaa eri toimijoiden erilaiset näkemykset yhteen ja päättää siitä mihin suuntaan työtä edistetään.



Esimerkki metsäohjelman rakenteesta

- Tällä sivulla on esitetty yksi esimerkki metsäohjelman rakenteesta
- Esitetyt metsäohjelman rakenne perustuu Rovaniemen kaupungin tarjouspyyntöön ja kokemukseemme aikaisemmista toteuttamistamme metsäohjelman laadintaan liittyvistä töistä.
- Työssä tuottettavan Rovaniemen metsäohjelman ohjelman rakenne perustuu
 - lähtöaineistoihin
 - riittävän kattavaan tietopohjaan
 - työvaiheitaisten tulosten hyödyntämiseen
 - selkeiden tavoitteiden muodostamiseen
 - konkreettisten, Rovaniemen toimintaympäristöön sopivien toimenpiteiden kuvaumiseen
 - realistiisiin, selkeisiin mittareihin, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan
- Rovaniemen metsäohjelman varsinaisen rakenne sovitaan työn ohjausryhmän kanssa ja sitä tarkennetaan työn edetessä
 - Seurantamittareiden laatimisessa voimme hyödyntää kokemustamme esimerikiksi Kuopion metsienhoidon seurantajärjestelmästä ja Hämeenlinnan metsäohjelman laadituista mittareista

1.	Johdanto
2.	Metsähjelma – esittely, mikä ja miksi
3.	Toimintaympäristön kuvaus; miten mm. erilait ja asetukset, metsähoidon suosituksset sekä metsäsertifioinnin kriteerit sekä Rovaniemen kaupungin muut strategiat ja ohjelmat vaikuttavat metsien hoitoon.
4.	Osallistamisprosessi – kysely ja sen tulokset, johtopäätökset
5.	Metsien hoidon tavoitteet ja toimenpiteet
6.	Metsien hoidon monimuotoisuus

METSÄLUONNON MONIMUOTOISUUDEN TAVOITE:

Turvataan ja vahvistetaan metsäläuonnon monimuotoisuutta.

TOIMENPITEET

- Uusia suojealueita perustetaan alueille, joille kohdistuu erityisen arvokkaita luonto-, virkistys- tai maisema-arvoja. Uusia suojealueita perustetaessa otetaan huomioon yhtenäisten suojealueverkostojen muodostamisen mahdollisuudet.
- Lisätään aktiivisesti laho- ja lehтиpuun määrää metsissä.
- Tunnistetaan metsäläuonnon monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet ja lajisto sekä toimitaan niiden hyväksi sieni, että näiden ominaispiirteet vahvistuvat ja lajisto säilyy.
- Pidetään yllä ajantasaista paikallitoa metsäläuonnon monimuotoisuudelle arvokkaista kohteista ja lajistosta.
- Metsien hoidon ja käytön suunnittelussa otetaan huomioon alueiden yhtenäisyys, viheralueiden yhteydet pyritään säilyttämään.
- Pidetään yllä hyvää metsäläuonnonhoidon ammattitaitoa.
- Hyödynnetään luonnonhoidon keinuja metsäläuonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja vahvistamisessa.
- Hakkuiden toteutusta painotetaan lintujen pesimäkauden ulkopuolelle.

KUNNOSSAPITOLUOKKAKOHTAISET TOIMENPITEET

Talousmetsät

- Talousmetsien luonnonhoidtoon panostetaan lisäämällä metsäläuonnon monimuotoisuudelle arvokkaita rakennepiirteitä, kuten säästö- ja lahopuita sekä jättämällä vesistöjen rannoille riittävän leveitä suojakalstoja. Lahopuita lisätään tekemällä hakkuiden yhteydessä tekopäkkeliötä.
- Lisätään lehтиpuuosuuutta taimikoissa.

Lähimetsät

- Puuston kiertaojat ovat pidempää lähimetsissä.
- Lähimetsien metsähaitto perustuu peitteelliseen metsänkasvatukseen, jossa päämenetelmänä ovat harvennushakkuut, pojimintaa- ja pienaukkohakkuut sekä mahdolliset pienpuiston hoidot. Hoidon tavoitteena on turvata ja vahvistaa metsäläuonnon monimuotoisuutta ja virkistysarvoja.

Harjumetsät

- Alueiden metsähaitto perustuu peitteelliseen metsänkasvatukseen, jossa päämenetelmänä ovat harvennushakkuut, pojimintaa- ja pienpuiston hoidot. Hoidon tavoitteena on turvata ja vahvistaa metsäläuonnon monimuotoisuutta ja virkistysarvoja.
- Alueiden tärkeiden elinympäristöjen, kuten paanderinteiden ja lehtojen sekä niissä elävien lajistojen elinoloja pyritään parantamaan metsän- ja luonnonhoidon toimenpiteillä, kuten ennallistamistoimilla ja kuusettumisen torjunnalla.

Suojealueet

- Luonnonhoidon toimenpiteillä parannetaan harvinaisimpien elinympäristöjen, kuten lehtojen ja harjujen paahterinteiden, tilaa.

Referenssejämme



TAPIO

Hämeenlinnan metsäohjelma

- Hämeenlinnan kaupungin metsäohjelmassa on kuvattu, miten virkistyskäyttö, luonnon monimuotoisuus, talous, maisemavrovat ja ilmastotavoitteet sovitaan yhteen metsien hoidossa.
- Metsäohjelmaan määriteltiin metsien hoidon tavoitteet ja päätoimintalinjat eri kunnossapitoluokille. Kaupungilla on noin 5 800 hehtaarin suuruinen metsäomaisuus
- Tapio vastasi tarkennetuista metsälaskennista, osallistamisesta ja ohjelman sisällön koostamisesta yhdessä kaupungin työryhmän kanssa
- Hämeenlinnan asukkaita ja päätäjää osallistettiin vuorovaikuttaisella metsäkyselyllä ja -kävelyllä. Hämeenlinnan kaupungin metsien pitkän ajan kehityksen arviointia varten Tapio toteutti strategisen tason laskennat.
- Hämeenlinnan metsäohjelma löytyy sivulta:
<https://www.hameenlinna.fi/asuminen-ja-ymparisto/puistot-ja-metsat/kaupungin-metsat/>





TAPIO

Oulun metsien hoito- ja käyttösuunnitelma

- Metsien hoito- ja käyttösuunnitelma määrittelee Oulun metsäomaisuuden hoidon strategian.
- Suunnitelma laadittiin yhteistyössä Oulun kaupungin asiantuntijoiden ja Tapio Palvelut Oy:n kanssa.
- Tapio teki suunnitelman taustaksi skenaariolaskelmat, joissa ennustettiin puiston ja metsän hiilitaseen kehittymistä erilaisilla toimenpiteivaihtoehdolla.
- Hoito- ja käyttösuunnitelman taustaksi toteutettiin laaja osallistamisprosessi. Osallistamisen keskiössä Oulussa olivat sidosryhmät, joille järjestettiin kesäkuussa 2022 webinaari ja kysely sekä työpaja elokuussa 2022.
- <https://www.ouka.fi/documents/64417/133593/Oulun+kaupungin+metsien+hoito-+ja+k%C3%A4ytt%C3%B6suunnitelma+2024-2033.pdf/0989bd1b-420a-48a9-964a-5f6b94d0fe73>



Metsien hoito- ja käyttösuunnitelma

Maa ja maittaus



Jyväskylän metsäohjelman auditointi (2022)



- Vuonna 2018 käytöönnotetun metsäohjelman auditointi, johon kuului tausta-aineistoihin perehtyminen, keskeisten toimijoiden haastattelut sekä maastokohteilla tehty inventointi. metsäohjelman auditoinnissa haastateltiin kaupungin metsähoidosta vastaavia asiantuntijoita sekä Jyväskylän metsänhoidon käytännön prosessiin osallistuvia toimijoita.
- metsäohjelman auditoinnilla tuotettiin Jyväskylän kaupungin käyttöön riippumaton asiantuntija-arvio siitä, onko metsäohjelman hyväksymisen jälkeen toteutettu metsänhoito ollut ohjelman mukaista ja ovatko ohjelmaan kirjatut tavoitteet toteutuneet.
 - Jyväskylän metsäohjelman auditoinnin raportti löytyy sivulta:
<https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/metsat/jyvaskylan-metsaohjelma>



Sini Miettinen

sini.miettinen@tapio.fi
p. 040 5141 352
